



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



Tabela 1 – Detalhamento de serviços executados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	1º Medição		
							Quant. Medida	% Item Medido	Total Medido
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.557,40			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	277,09	339,35	977,32	2,88	100%	R\$ 977,33
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	415,22	2,44	2,98	1.237,35	415,22	100%	R\$ 1.237,36
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,90	35,15	43,04	4.342,73	100,90	100%	R\$ 4.342,74
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					R\$ 11.575,76			
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	77,55	94,97	2.279,28	8,00	33%	R\$ 759,76
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	27,60	33,80	32.448,00	320,00	33%	R\$ 10.816,00
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					R\$ 6.288,21			
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,00	41,21	50,46	50,46	0,00	0%	R\$ 0,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,84	440,50	539,48	453,16	0,00	0%	R\$ 0,00
3.3	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE	m²	1,80	22,75	27,86	50,14	0,00	0%	R\$ 0,00

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 – CREA 388918-EN – CREA 388918-EN – Av. Ribeiro Franco, 2768, Jd. São João - CEP 76890-000

GTX ENGENHARIA LTDA

Responsável

SEMPER

Página 2 de 30

Responsável

SEMPER

Responsável

CANCELADO




3.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,19	6,57	8,04	65,84	0,00	0%	R\$ 0,00
3.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00	23,61	29,91	57,82	0,00	0%	R\$ 0,00
3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	299,51	16,54	20,25	6.065,07	0,00	0%	R\$ 0,00
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.607,40	2,47	3,02	4.854,34	450,00	28%	R\$ 1.359,00
3.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.607,40	5,32	6,51	10.464,17	450,00	28%	R\$ 2.929,50
3.9	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 6,1, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	58,93	72,17	793,87	3,00	27%	R\$ 216,51
3.10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 6M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	29,00	133,59	163,60	4.744,40	8,00	28%	R\$ 1.308,80
3.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	8,69	10,64	159,60	0,00	0%	R\$ 0,00
3.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.528,36	1,26	1,54	2.353,67	308,05	20%	R\$ 474,40
3.13	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,70	2,37	2,90	239,83	0,00	0%	R\$ 0,00
4.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 4.075,84

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005

GTx ENGENHARIA LTDA
209 - CREA/RO 89183-0 - CAL. PI 42551 - A. Rio Branco

Responsible: [Signature]
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005

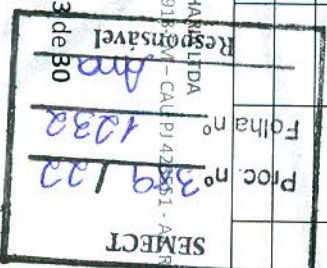





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30 M. AF_02/2021	m³	5,19	62,93	77,07	399,99	5,19	100%	R\$ 399,99
4.2	ATERRO MANUAL DE SOLO (ARGILA OU BARRO) E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	51,16	58,67	71,85	3.675,84	51,16	100%	R\$ 3.675,85
5.0	ESTRUTURAL					59.259,94			R\$ 14.463,41
5.1	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 cm	m³	11,62	463,81	568,02	6.600,39	5,60	48%	R\$ 3.180,91
5.2	SALA DE AULA								
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,69	110,35	135,14	228,38	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,00	14,64	17,92	985,60	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,00	18,13	22,20	799,20	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,50	93,25	114,20	171,30	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,47	63,55	77,82	1.437,33	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00	17,26	21,13	845,20	0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREX/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Bran






PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



5.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,40	113,20	138,63	3.659,83	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,00	14,60	17,88	2.127,72	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	18,24	22,33	1.451,45	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	18,47	83,01	101,66	1.877,66	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00	17,34	21,23	785,51	0,00	0%	R\$ 0,00
5.2.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,93	422,57	517,52	3.068,89	0,00	0%	R\$ 0,00
5.3	PÁTIO								
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	2,70	110,35	135,14	364,87	2,70	100%	R\$ 364,88
5.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,00	14,64	17,92	1.738,24	97,00	100%	R\$ 1.738,24

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco,



000000000000





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

5.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,00	18,13	22,20	1.798,20	81,00	100%	R\$ 1.798,20
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	3,43	93,25	114,20	391,70	3,43	100%	R\$ 391,71
5.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,95	63,55	77,82	3.186,72	40,95	100%	R\$ 3.186,73
5.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,00	17,26	21,13	1.732,66	82,00	100%	R\$ 1.732,65
5.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,08	113,20	138,63	6.388,07	0,00	0%	R\$ 0,00
5.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,00	14,60	17,38	3.647,52	0,00	0%	R\$ 0,00
5.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,00	18,24	22,33	3.327,17	0,00	0%	R\$ 0,00
5.3.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	40,80	83,01	101,66	4.147,72	4,00	30%	R\$ 2.070,08

SEMECT

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 1278, Centro Jaru/RO - CEP: 76890-000

GTX ENGENHARIA LTDA

SEMECT

Responsável

Folha nº 1035
Proc. nº 389122

Responsável

Proc. nº 389122

CANCELADO

Responsável

Folhas nº 2031

Proc. nº 389122

CANCELADO



5.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	17,34	21,23	1.698,40	0,00	0%	R\$ 0,00
5.3.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	13,14	422,57	517,52	6.800,21	0,00	0%	R\$ 0,00
6.0	ALVENARIA								
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES NA ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²				12.386,32			
7.0	COBERTURA		145,67	69,43	85,03	12.386,32	0,00	0%	R\$ 0,00
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN							
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	663,85	813,01	344.088,96	0,00	0%	R\$ 55.232,65
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	883,13	1.081,56	3.244,68	3,00	100%	R\$ 3.244,68
			5,00	1.550,24	1.898,57	9.492,85	2,00	40%	R\$ 3.797,14

SEMECT

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RN 80.000.000-0

GTX ENGENHARIA LTDA

R

Folha 1

Proc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS

SEMECT

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000524/209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 12378 - Centro - Fone: (16) 3359-1111

GTx ENGENHARIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



7.4	F. BRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU T. RMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	1.764,46	2.160,93	15.126,51	3,00	43%	R\$ 6.482,79
7.5	F. BRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU T. RMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	7,00	1.889,96	2.314,63	16.202,41	3,00	43%	R\$ 6.943,89
7.6	F. BRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU T. RMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	m²	6,00	2.403,49	2.943,55	17.661,30	3,00	50%	R\$ 8.830,65
7.7	F. BRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU T. RMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	4,00	2.724,30	3.336,45	19.345,80	0,00	0%	R\$ 0,00
7.8	F. BRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU T. RMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	3,00	2.870,96	3.516,06	10.548,18	0,00	0%	R\$ 0,00
7.9	T. LHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM R. COBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM II. CLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. A_07/2019	m²	2.310,81	38,25	46,84	108.238,34	0,00	0%	R\$ 0,00
7.10	T. LAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A_07/2019	m²	2.310,81	47,06	57,63	133.171,98	450,00	19%	R\$ 25.933,50
7.11	C. MEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	206,02	61,16	74,90	15.430,89	0,00	0%	R\$ 0,00
8.0	F. RRO					162.354,82			

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 378, Centro, Jaru/RO - CEP 76890-000

Proc. nº 389/2033
SEMECT
CANCELAÇÃO
Responsável: [assinatura]

Proc. nº 389/2033
SEMECT
CANCELAÇÃO
Responsável: [assinatura]

Proc. nº 2033
CANCELAÇÃO
Responsável: [assinatura]




PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



8.1	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.280,40	51,95	63,62	145.079,04	0,00	0%	R\$ 0,00
8.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.616,07	8,73	10,69	17.275,78	0,00	0%	R\$ 0,00
9.0	REVESTIMENTO DE PISO					117.261,59			R\$ 0,00
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM POLIDORA POLIDORA INCOLOR, Efeito em Ombra, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ANIMADO. AF_07/2016	m²	3,54	646,90	794,70	2.813,23	0,00	0%	R\$ 0,00
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	441,75	24,59	30,11	13.301,09	0,00	0%	R\$ 0,00
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	583,25	96,11	117,70	68.648,52	0,00	0%	R\$ 0,00
9.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	51,10	16,86	20,64	1.054,70	0,00	0%	R\$ 0,00
9.5	LIXAMENTO DE PISO COM POLIDORA E APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR EM PISO GRANILITE	m²	1.465,24	17,53	21,46	31.444,05	0,00	0%	R\$ 0,00
10.0	REVESTIMENTO PAREDE					33.076,02			R\$ 0,00
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	426,73	3,20	3,91	1.668,51	0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8978-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 76890-000

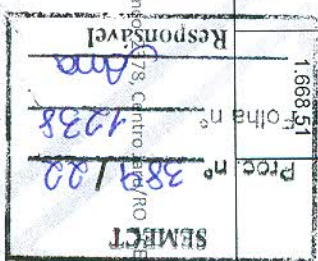



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



	m²						0,00	0%	R\$ 0,00
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		74,64	29,74	36,42	2.718,38	0,00	0%	R\$ 0,00
10.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	m²	546,37	30,77	37,68	20.587,22	0,00	0%	R\$ 0,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	134,74	49,10	60,13	8.101,91	0,00	0%	R\$ 0,00
11.0	ESQUADRIAS					9.745,78	0,00	0%	R\$ 0,00
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	620,34	759,73	759,73	0,00	0%	R\$ 0,00
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	638,66	782,16	2.346,48	0,00	0%	R\$ 0,00

GTx ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro, CEP 76890-000

CANCELADO
Proc. nº 389/20
Folha nº 1566
Responsável

CANCELADO
Proc. nº 389/20
Folha nº 1539
Responsável

CANCELADO
Proc. nº 2035
Folha nº 22
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



11.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, NÚCLEO SÓLIDO, 90X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATES, FECHADURA, BARRAS DE APOIO E CHAPA DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	957,86	1.173,09	2.346,18	0,00	0%	R\$ 0,00
11.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	8,00	328,33	402,71	3.221,68	0,00	0%	R\$ 0,00
12.0	PINTURA	m²				43.639,69	0,00	0%	R\$ 0,00
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	546,37	10,70	13,10	7.157,44	0,00	0%	R\$ 0,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	546,37	1,81	2,21	1.207,47	0,00	0%	R\$ 0,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	2.537,95	11,23	13,75	34.896,81	0,00	0%	R\$ 0,00
12.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO, AF_01/2021	m²	22,26	13,87	16,98	377,97	0,00	0%	R\$ 0,00
13.0	ACESSIBILIDADE	M	36,50	124,87	152,92	5.585,58	0,00	0%	R\$ 0,00
	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020					24.622,81			

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro/Teixeiraópolis/RO - CEP 76890-000

Proc. nº 389/2020
Forma nº 1567
Responsável: [Assinatura]

SEMPRE
Proc. nº 389/2020
Forma nº 1240
Responsável: [Assinatura]

Proc. nº 389/2020
Forma nº 2036
Responsável: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



13.2	MAPA TÁTIL EM ACRÍICO, COM RELEVO EM BRAILLE, INCLUSO FIXAÇÃO DO PEDESTAL	und	1,00	2.616,36	3.204,25	3.204,25	0,00	0%	R\$ 0,00
13.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	10,10	95,51	116,97	1.181,39	0,00	0%	R\$ 0,00
13.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	18,85	533,74	653,67	12.321,67	0,00	0%	R\$ 0,00
13.5	SANITA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	192,15	235,32	470,64	0,00	0%	R\$ 0,00
13.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	193,97	244,90	979,60	0,00	0%	R\$ 0,00
13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	180,39	220,92	883,68	0,00	0%	R\$ 0,00
14.0	HIDROSSANITARIO					6.339,88			R\$ 0,00
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,45	5,44	10,88	0,00	0%	R\$ 0,00
14.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,76	15,62		0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RIO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco 1229 - Centro - CEP 28.900-000

SEMECT
Proc. nº 389/100
Folha nº 1568
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/100
Folha nº 1041
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/100
Folha nº 1041
Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



14.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,38	7,81	15,62	0,00	0%	R\$ 0,00
14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	16,02	19,61	137,27	0,00	0%	R\$ 0,00
14.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	481,29	589,43	1.178,86	0,00	0%	R\$ 0,00
14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENLATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	330,96	405,32	2.431,92	0,00	0%	R\$ 0,00
14.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	71,57	87,65	438,25	0,00	0%	R\$ 0,00
14.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, JSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO EMFLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EMFLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	153,51	188,00	752,00	0,00	0%	R\$ 0,00
14.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO COM RESERVATÓRIO 800 A 1.100 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	51,77	63,40	253,60	0,00	0%	R\$ 0,00
14.10	PORTA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	4,00	49,52	60,64	242,56	0,00	0%	R\$ 0,00
14.11	PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DI (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	8,00	52,80	64,66	517,28	0,00	0%	R\$ 0,00

CNPJ 32.300.342/00

GTX ENGENHARIA LTDA
-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2878, Centro, São Paulo/RO CEP 76890-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS

14.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	33,73	41,30	330,40	0,00	0%	R\$ 0,00
15.0	DRENAGEM PLUVIAL								
15.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	64,00	636,91	780,02	123.059,33	52,00	81%	R\$ 59.078,96
15.3	ELASTICA FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	140,00	35,84	43,89	6.144,60	2,00	3%	R\$ 70,54
15.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	70,00	28,80	35,27	2.468,90			
15.5	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	595,00	53,54	65,57	39.014,15	280,00	47%	R\$ 18.359,60
	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	320,00	65,10	79,72	25.510,40	0,00	0%	R\$ 0,00
16.0	INSTALAÇÕES ELETRICA					180.063,03			R\$ 0,00

SEMECT
Proc. nº 389/20
Folha nº 1570
Responsável

CANCELADO

SEMECT
Proc. nº 389/20
Folha nº 1243
Responsável

CANCELADO
Proc. nº 2039
Folha nº 2039
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



16.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,05	8,77	10,74	1.343,03	0,00	0%	R\$ 0,00
16.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,81	16,34	20,01	296,34	0,00	0%	R\$ 0,00
16.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,92	13,87	16,98	219,38	0,00	0%	R\$ 0,00
16.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	535,51	10,20	12,49	6.688,51	0,00	0%	R\$ 0,00
16.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,92	13,87	16,98	219,38	0,00	0%	R\$ 0,00
16.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,33	8,33	10,20	1.971,96	0,00	0%	R\$ 0,00
16.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,19	15,91	19,48	393,30	0,00	0%	R\$ 0,00
16.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,20	12,84	15,72	191,78	0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 239 - Centro - Jaru/RO - CEP 76900-000

SEMPACT
Proc. nº 389100
Folha nº 1571
Responsável

SEMPACT
Proc. nº 389100
Folha nº 1244
Responsável

CANCELADO
2040



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



16.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	828,03	9,72	11,90	9.853,55	0,00	0%	R\$ 0,00
16.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,21	13,87	16,98	597,86	0,00	0%	R\$ 0,00
16.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,27	20,72	25,37	3.254,20	0,00	0%	R\$ 0,00
16.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,05	13,91	17,03	205,21	0,00	0%	R\$ 0,00
16.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.068,51	7,74	9,47	29.058,78	0,00	0%	R\$ 0,00
16.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.738,69	3,44	4,21	19.949,88	0,00	0%	R\$ 0,00
16.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.320,65	5,65	6,91	16.035,69	0,00	0%	R\$ 0,00
16.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	334,64	23,39	28,64	9.584,08	0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2

Proc. nº 389/122
Folha nº 1572
Responsável

CANCELADO

Proc. nº 389/122
Folha nº 1245
Responsável

CANCELADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

16.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	353,05	31,59	38,68	13.655,97	0,00	0%	R\$ 0,00
16.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	20,36	24,93	822,69	0,00	0%	R\$ 0,00
16.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,22	39,45	78,90	0,00	0%	R\$ 0,00
16.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					0,00	0%	R\$ 0,00
16.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,99	11,01	198,18	0,00	0%	R\$ 0,00
16.23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	426,00	5,09	6,23	2.653,98	0,00	0%	R\$ 0,00
16.24	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	11,70	14,32	286,40	0,00	0%	R\$ 0,00
16.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00	3,84	4,70	460,60	0,00	0%	R\$ 0,00
16.26	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	14,52	17,78	213,36	0,00	0%	R\$ 0,00

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RG 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Bra

GTx ENGENHARIA LTDA

SEMPRE
CANCELAÇÃO
Folha nº 1573
Proc. nº 389/100
Responsável

SEMPRE
CANCELAÇÃO
Folha nº 1246
Proc. nº 389/100
Responsável

SEMPRE
CANCELAÇÃO
Folha nº 2042
Proc. nº 389/100
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



16.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,75	14,39	14,39	0,00	0%	R\$ 0,00
16.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00	10,56	12,93	633,57	0,00	0%	R\$ 0,00
16.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	213,00	11,48	14,05	2.992,65	0,00	0%	R\$ 0,00
16.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	17,92	21,94	219,40	0,00	0%	R\$ 0,00
16.32	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	32,98	40,39	1.534,82	0,00	0%	R\$ 0,00
16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	23,27	28,49	170,94	0,00	0%	R\$ 0,00
16.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	24,21	29,64	148,20	0,00	0%	R\$ 0,00
16.35	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	154,00	21,52	26,35	4.057,90	0,00	0%	R\$ 0,00
16.36	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	23,02	28,19	366,47	0,00	0%	R\$ 0,00
16.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55,00	8,61	10,54	579,70	0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco 878, Centro - 76890-000

Procedimento nº 389/2022
Folha nº 1534
Responsável
CANCELADO

Procedimento nº 389/2022
Folha nº 2043
Responsável
CANCELADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



16.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	9,07	11,10	22,20	0,00	0%	R\$ 0,00
16.39	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	41,18	50,43	302,58	0,00	0%	R\$ 0,00
16.40	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	42,10	51,55	1.649,60	0,00	0%	R\$ 0,00
16.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	51,63	63,29	126,58	0,00	0%	R\$ 0,00
16.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	55,03	66,40	132,88	0,00	0%	R\$ 0,00
16.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	115,00	140,64	704,20	0,00	0%	R\$ 0,00
16.44	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	309,37	378,88	378,88	0,00	0%	R\$ 0,00
16.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR, COM BARRAS GALVANIZADO, DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	785,58	962,09	3.848,36	0,00	0%	R\$ 0,00
16.46	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR, COM BARRAS GALVANIZADO, DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	650,79	797,02	797,02	0,00	0%	R\$ 0,00
16.47	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	21,72	26,60	26,60	0,00	0%	R\$ 0,00

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folha nº 1575
Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 1878, Centro - 76890-000

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folha nº 1575
Responsável

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folha nº 1575
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



16.48	ELETROCALHA PERFORADA TIPO U COM TAMPA (50x100x3000)mm, COM CONEXÕES	UND	38,00	156,84	192,08	7.299,04	0,00	0%	R\$ 0,00
16.49	SAÍDA LATERAL PARA ELETROCALHA PERFORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	108,00	48,83	59,80	6.458,40	0,00	0%	R\$ 0,00
16.50	LUMINÁRIA TIPO FLAPON, DE SOBREPOR LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	47,89	58,77	2.820,56	0,00	0%	R\$ 0,00
16.51	LUMINÁRIA TIPO FLAPON, SOBREPOR LED DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	275,00	52,56	64,09	17.813,75	0,00	0%	R\$ 0,00
16.52	LUMINÁRIA LED QUADRADA EMBUTIR 30 W	UN	25,00	185,18	226,78	5.669,50	0,00	0%	R\$ 0,00
16.53	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	154,00	8,12	9,94	1.530,76	0,00	0%	R\$ 0,00
16.54	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	11,88	14,54	261,72	0,00	0%	R\$ 0,00
16.55	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	21,91	26,83	1.019,54	0,00	0%	R\$ 0,00
16.56	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	5,55	6,79	88,27	0,00	0%	R\$ 0,00
16.57	CAIXA DE PISO EM LIGA DE ALUMÍNIO 4X2 FECHADA E BAIXA	UND	7,00	27,20	33,31	233,17	0,00	0%	R\$ 0,00

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RN 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Bra

CANCELADO
Proc. nº 389/108
Folha nº 1536
Responsável: Ana

CANCELADO
Proc. nº 389/108
Folha nº 1536
Responsável: Ana

CANCELADO
Proc. nº 389/108
Folha nº 1536
Responsável: Ana



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



17.0	SPDA	m³					103.867,65	26,00	44%	R\$ 28.463,12
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	59,40	62,93	77,07	4.577,95				R\$ 2.003,82
17.2	CORDOALHA DE COBRE N.º 50 MM², ENTERPADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	396,00	45,72	55,99	22.172,04	396,00	100%		R\$ 22.172,04
17.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	M	8,00	28,72	35,17	281,36	0,00	0%		R\$ 0,00
17.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	M	8,00	28,72	35,17	281,36	0,00	0%		R\$ 0,00
17.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	70,00	62,82	76,93	5.385,10	52,00	74%		R\$ 4.000,36
17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	28,72	35,17	281,36	0,00	0%		R\$ 0,00
17.7	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	122,00	149,41	149,41	0,00	0%		R\$ 0,00
17.8	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	89,10	109,12	109,12	0,00	0%		R\$ 0,00
17.9	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	145,75	178,50	178,50	0,00	0%		R\$ 0,00
17.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	23,43	28,69	286,90	10,00	100%		R\$ 286,90

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Bra

SEMECT
Proc. nº 389/20
1577
Folha nº
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/20
1250
Folha nº
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/20
1250
Folha nº
Responsável




PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



17.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	17,39	21,29	212,90	0,00	0%	R\$ 0,00
17.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	15,96	19,54	195,40	0,00	0%	R\$ 0,00
17.13	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	44,00	46,96	57,51	2.530,44	0,00	0%	R\$ 0,00
17.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	15,00	16,07	19,58	293,20	0,00	0%	R\$ 0,00
17.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	43,00	10,17	12,45	185,75	0,00	0%	R\$ 0,00
17.16	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	102,00	29,69	36,36	3.708,72	0,00	0%	R\$ 0,00
17.17	INSTALACAO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	1,00	22,47	27,51	27,51	0,00	0%	R\$ 0,00
17.18	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	44,00	40,74	49,89	2.195,16	0,00	0%	R\$ 0,00
17.19	CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 40 X 40 cm - DPS CLASSE 1 E FUSIVEL DIAZED 63 A	Pç	1,00	428,57	524,86	524,86	0,00	0%	R\$ 0,00
17.20	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	59,40	24,66	30,20	1.793,88	0,00	0%	R\$ 0,00
18.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA					4.539,69			

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco

6890-000

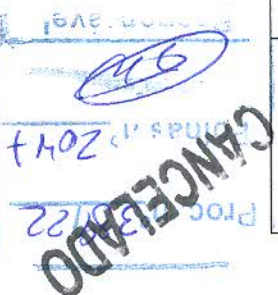



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

18.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

m²

2.030,96

2,63

3,22

6.539,69

Total sem BDI	1.063.132,51	Valor a ser pago 1º Medição	R\$ 185.735,36	Porcentagem Executada	14%
Total do BDI	238.885,88	CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
Total Geral	1.302.018,39				

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1530
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1539
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1532
Responsável

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CRI
GTX ENGENHARIA S.LTD.A - C.A.U. P. 15551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Figura 1: Percentual da estrutura metálica do telhado montada;



Figura 2: Percentual da estrutura metálica do telhado montada;

CANCELADO
389/22

Folhas nº 2049

[Signature]

Responsável

CANCELADO

Proc. nº 389/22

Folha nº 1580

[Signature]
Responsável

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1253

[Signature]
Responsável



Figura 3: Infraestrutura do pátio concretada;



Figura 4: Infraestrutura do pátio concretada;



SEMECT
CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folha nº 1582
Ara
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2051
STO
non save!

Figura 5: Cordoalha de cobre nu 50mm instalada;

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1255
Ara
Responsável

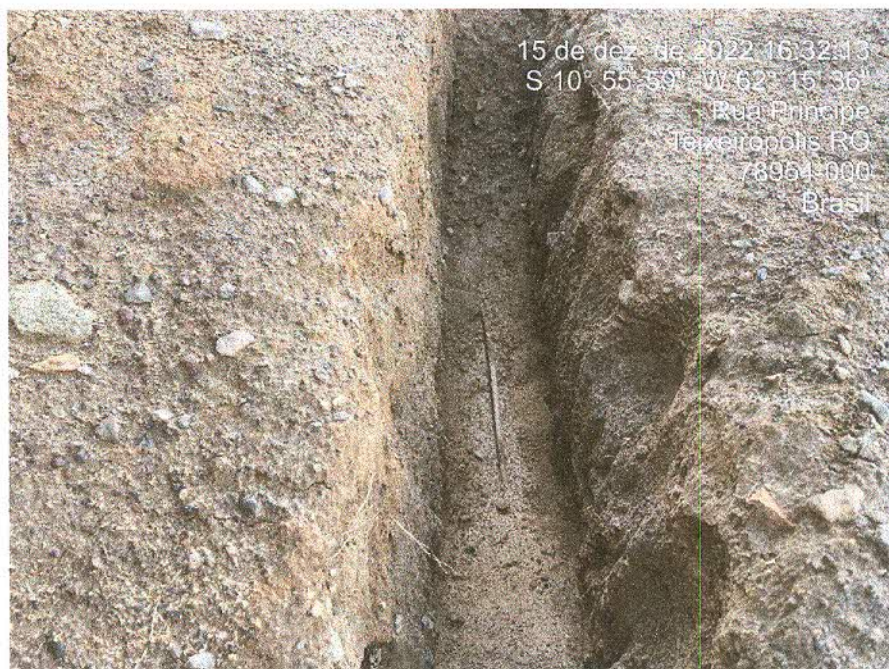


Figura 6: Cordoalha de cobre nu 50mm instalada;



Figura 7: Caixas pluviais;




Figura 8: Caixas pluviais;



Figura 9: Caixas pluviais e tubulação 100mm;



Figura 10: Caixas pluviais;



CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2054
SN
Responsável

Figura 11: Caixas pluviais;



SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1258
Am
Responsável

Figura 12: Caixas pluviais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1239

Responsável

3. CONCLUSÕES:

Diante das informações citadas acima segue para posterior decisão da Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, através do Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, para pagamento conforme descrição a seguir:

VALOR A SER PAGO (EXPRESSO EM NOTA FISCAL)	R\$ 185.735,36
(CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)	
PORCENTAGEM EXECUTADA	14%

Teixeiraópolis/RO, 16 de dezembro de 2022.



AMANDA NOVAIS
LOREDO DE
MELO:01280334282

Assinado de forma digital por AMANDA NOVAIS
LOREDO DE MELO:01280334282
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR RIO MADEIRA, ou=Presencial,
ou=23035197000108, cn=AMANDA NOVAIS
LOREDO DE MELO:01280334282

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.300.342/0001-13
