

CANCELADO
Proc. nº 389/22

Folhas nº 2117



Responsável

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA

1. PREÂMBULO:

A empresa **GTX ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **32.300.342/0001-13**, sediada à Avenida Rio Branco, nº. 2378, Setor 01, município de Jarú, estado de Rondônia, cumprindo o **Contrato de Prestação de Serviço nº. 025/PJM/2020, Processo Administrativo nº. 313/2020** para essa Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, vem por meio deste emitir o seguinte parecer:

Em análise ao Processo nº. 389/2022 adjudicado à **D.R. CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.610.014/0001-15 com sede à Rua Rio de Janeiro, nº. 3772 – Compl. Sala A – Setor 02, município de Jarú, estado de Rondônia, sendo esta vencedora do serviço referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO AMORIM, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/CPL/2022, PROCESSO Nº 389/2022**, bem como conforme visita técnica realizada aos dias 19 (dezenove) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), conclui-se que os serviços apresentados da Tabela 1, foram executados.

Ante ao exposto, apresenta-se a planilha de medição de obra, conforme requerido:


SEMECT	
Proc. nº	389/22
Folha nº	1322
	
Responsável	

Tabela 1 - Detalhamento de serviços executados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL	2ª Medição			Valores a Executar		
							Quant. Medida	% Item Medido	Total Medido	Quant.	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					6.557,40			R\$ 0,00			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	277,09	339,35	977,32	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	415,22	2,44	2,98	1.237,35	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,90	35,15	43,04	4.342,73	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					34.727,28						
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	77,55	94,97	2.279,28	4,00	17%	R\$ 5.111,88			
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	27,60	33,80	32.448,00	140,00	15%	R\$ 379,88	12,00	1.139,64	50%
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA					30.352,37			R\$ 4.732,00	500,00	16.900,00	52%
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,00	41,21	50,46	0,00	0,00	0%	R\$ 6.819,51			
3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,84	440,50	539,48	0,00	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	50,46	100%
3.3	REMOÇÃO DE DIVISORIA DE GRANILITE	m²	1,80	22,75	27,86	50,14	0,00	0%	R\$ 0,00	1,80	453,16	100%

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551
 GTX ENGENHARIA LTDA
 Rua Branco, 230 - Centro - CEP 76890-000 - Rio Branco, RO

Página 2 de 30

CANCELADO
 Proc. nº 389/22
 Folhas nº 2118
 Responsável: *[Assinatura]*

SEMECT
 Proc. nº 389/22
 Folha nº 1323
 Responsável: *[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



3.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,19	6,57	8,04	65,84	0,00	0%	R\$ 0,00	8,19	65,85	100%
3.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00	23,61	28,91	57,82	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	57,82	100%
3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	299,51	16,54	20,25	6.065,07	0,00	0%	R\$ 0,00	299,51	6.065,08	100%
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.607,40	2,47	3,02	4.854,34	420,00	26%	R\$ 1.268,40	737,40	2.226,95	46%
3.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.607,40	5,32	6,51	10.464,17	420,00	26%	R\$ 2.734,20	737,40	4.800,47	46%
3.9	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	58,93	72,17	793,87	3,00	27%	R\$ 216,51	5,00	360,85	45%
3.10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	29,00	133,59	163,60	4.744,40	11,00	38%	R\$ 1.799,60	10,00	1.636,00	34%
3.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00	8,69	10,64	159,60	0,00	0%	R\$ 0,00	15,00	159,60	100%
3.12	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.528,36	1,26	1,54	2.353,67	520,00	34%	R\$ 800,80	700,31	1.078,48	46%
3.13	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	82,70	2,37	2,90	239,83	0,00	0%	R\$ 0,00	82,70	239,83	100%

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

CANCELADO
Proc. nº 389/22

Folhas nº 2119

Responsável

Proc. nº 389/22

Folha nº 1324

Responsável



GTX ENGENHARIA LTDA

Q - CEP 76890-000

Responsável

SP
Personnel

5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,00	17,26	21,13	845,20	20,00	50%	R\$ 422,60	20,00	422,60	50%
5.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	26,40	113,20	138,63	3.659,83	0,00	0%	R\$ 0,00	26,40	3.659,83	100%
5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,00	14,60	17,88	2.127,72	0,00	0%	R\$ 0,00	119,00	2.127,72	100%
5.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	18,24	22,33	1.451,45	0,00	0%	R\$ 0,00	65,00	1.451,45	100%
5.2.10	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	18,47	83,01	101,66	1.877,66	0,00	0%	R\$ 0,00	18,47	1.877,66	100%
5.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00	17,34	21,23	785,51	0,00	0%	R\$ 0,00	37,00	785,51	100%
5.2.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,93	422,57	517,52	3.068,89	1,00	17%	R\$ 517,52	4,93	2.551,37	83%
5.3	PÁTIO											

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1326
Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av.

5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,70	110,35	135,14	364,87	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,00	14,64	17,92	1.738,24	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,00	18,13	22,20	1.798,20	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	3,43	93,25	114,20	391,70	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	40,95	63,55	77,82	3.186,72	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,00	17,26	21,13	1.732,66	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
5.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	46,08	113,20	138,63	6.388,07	39,00	85%	R\$ 5.406,57	7,08	981,50	15%
5.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,00	14,60	17,88	3.647,52	180,00	88%	R\$ 3.218,40	24,00	429,12	12%

SEMECT
Proc. nº 389/122
Folha nº 1327
Responsável

CAIXEIADO
Proc. nº 389/122
Folhas nº 2122
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

5.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,00	18,24	22,33	3.327,17	90,00	60%	R\$ 2.009,70	59,00	1.317,47	40%
5.3.10	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	40,80	83,01	101,66	4.147,72	19,00	47%	R\$ 1.931,54	21,80	2.216,19	53%
5.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	17,34	21,23	1.698,40	42,00	53%	R\$ 891,66	38,00	806,74	48%
5.3.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	13,14	422,57	517,52	6.800,21	4,00	30%	R\$ 2.070,08	5,14	2.660,05	39%
6.0	ALVENARIA					12.386,32			R\$ 850,30			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	145,67	69,43	85,03	12.386,32	10,00	7%	R\$ 850,30	135,67	11.536,02	93%
7.0	COBERTURA					344.088,96			R\$ 62.163,94			
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	2,00	663,85	813,01	1.626,02	1,00	50%	R\$ 813,01	1,00	813,01	50%

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1328
Ana
Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 – CREA/RO 8918-EM – CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro/Jaru/RO CEP 76890-006

7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	UN	3,00	883,13	1.081,56	3.244,68	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	UN	5,00	1.550,24	1.898,57	9.492,85	3,00	60%	R\$ 5.695,71	-	-	0%
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	UN	7,00	1.764,46	2.160,93	15.126,51	4,00	57%	R\$ 8.643,72	-	-	0%
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	UN	7,00	1.889,96	2.314,63	16.202,41	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	9.258,52	57%
7.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	m²	6,00	2.403,49	2.943,55	17.661,30	0,00	0%	R\$ 0,00	3,00	8.830,65	50%
7.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	UN	4,00	2.724,30	3.336,45	13.345,80	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	13.345,80	100%
7.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 12/2015	UN	3,00	2.870,96	3.516,06	10.548,18	0,00	0%	R\$ 0,00	3,00	10.548,18	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2329
[Assinatura]
Responsável

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1329
[Assinatura]
Responsável

CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00600005247209 – CREA/RO 8918-EM – CAU PJ 423551 – Av. Rio Branco, 2378 – CEP 76890-000
GTX ENGENHARIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

7.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.310,8 1	38,25	46,84	108.238,34	450,00	19%	R\$ 21.078,00	1.860,8 1	87.160,34	81%
7.10	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.310,8 1	47,06	57,63	133.171,98	450,00	19%	R\$ 25.933,50	1.410,8 1	81.304,98	61%
7.11	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	206,02	61,16	74,90	15.430,89	0,00	0%	R\$ 0,00	206,02	15.430,90	100%
8.0	FORRO					162.354,82			R\$ 0,00			
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.280,4 0	51,95	63,62	145.079,04	0,00	0%	R\$ 0,00	2.280,4 0	145.079,05	100%
8.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.616,0 7	8,73	10,69	17.275,78	0,00	0%	R\$ 0,00	1.616,0 7	17.275,79	100%
9.0	REVESTIMENTO DE PISO					117.261,59			R\$ 0,00			
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	3,54	648,90	794,70	2.813,23	0,00	0%	R\$ 0,00	3,54	2.813,24	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22

Folhas nº 2125

Responsável

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1330

Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.360.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	441,75	24,59	30,11	13.301,09	0,00	0%	R\$ 0,00	441,75	13.301,09	100%
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	583,25	96,11	117,70	68.648,52	0,00	0%	R\$ 0,00	583,25	68.648,53	100%
9.4	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	51,10	16,86	20,64	1.054,70	0,00	0%	R\$ 0,00	51,10	1.054,70	100%
9.5	LIXAMENTO DE PISO COM POLIDORA E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA INCOLOR EM PISO GRANILITE	m²	1.465,24	17,53	21,46	31.444,05	0,00	0%	R\$ 0,00	1.465,24	31.444,05	100%
10.0	REVESTIMENTO PAREDE					33.076,02			R\$ 0,00			
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	426,73	3,20	3,91	1.668,51	0,00	0%	R\$ 0,00	426,73	1.668,51	100%
10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	74,64	29,74	36,42	2.718,38	0,00	0%	R\$ 0,00	74,64	2.718,39	100%
10.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	546,37	30,77	37,68	20.587,22	0,00	0%	R\$ 0,00	546,37	20.587,22	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22

Folhas nº 2228

Responsável

Proc. nº 389/22

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1331

Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PI 423551-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	134,74	49,10	60,13	8.101,91	0,00	0%	R\$ 0,00	134,74	8.101,92	100%
11.0	ESQUADRIAS					9.745,78			R\$ 0,00			
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	620,34	759,73	759,73	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	759,73	100%
11.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	638,66	782,16	2.346,48	0,00	0%	R\$ 0,00	3,00	2.346,48	100%
11.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, NÚCLEO SÓLIDO, 90X210CM, E=3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATES, FECHADURA, BARRAS DE APOIO E CHAPA DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	957,86	1.173,09	2.346,18	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	2.346,18	100%
11.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,00	328,83	402,71	3.221,68	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	3.221,68	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22

Folhas nº 2122

Responsável

SEMECT

Proc. nº 389 / 22

Folha nº 1332

Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PI 42551 - Av. Rio Branco, 237 - Centro Jaru/RO - CEP 76890-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS

11.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE EFERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,60	546,93	669,82	1.071,71	0,00	0%	R\$ 0,00	1,60	1.071,71	100%
12.0	PINTURA					43.639,69			R\$ 0,00			
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	546,37	10,70	13,10	7.157,44	0,00	0%	R\$ 0,00	546,37	7.157,45	100%
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	546,37	1,81	2,21	1.207,47	0,00	0%	R\$ 0,00	546,37	1.207,48	100%
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.537,95	11,23	13,75	34.896,81	0,00	0%	R\$ 0,00	2.537,95	34.896,81	100%
12.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	22,26	13,87	16,98	377,97	0,00	0%	R\$ 0,00	22,26	377,97	100%
13.0	ACESSIBILIDADE					24.622,81			R\$ 0,00			
13.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	36,50	124,87	152,92	5.581,58	0,00	0%	R\$ 0,00	36,50	5.581,58	100%
13.2	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO, COM RELEVO EM BRAILLE, INCLUSO FIXAÇÃO DO PEDESTAL	und	1,00	2.616,36	3.204,25	3.204,25	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	3.204,25	100%
13.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	10,10	95,51	116,97	1.181,39	0,00	0%	R\$ 0,00	10,10	1.181,40	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folha nº 1333
Ana
Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - A
Brasão, 2378, Centro - Jd. Santa Rosa/RO - CEP 76890-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

13.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	18,85	533,74	653,67	12.321,67	0,00	0%	R\$ 0,00	18,85	12.321,68	100%
13.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	192,15	235,32	470,64	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	470,64	100%
13.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	199,97	244,90	979,60	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	979,60	100%
13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	180,39	220,92	883,68	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	883,68	100%
14.0	HIDROSSANITARIO					6.339,88			R\$ 0,00			
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,45	5,44	10,88	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	10,88	100%
14.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,76	15,62	31,24	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	31,24	100%
14.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,38	7,81	15,62	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	15,62	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2.29
SPE

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1334
Responsável: Ama

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. R. Branco, 2378, Centro - Fone: (11) 3333-1111 - CEP 76890-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS

14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,00	16,02	19,61	137,27	0,00	0%	R\$ 0,00	7,00	137,27	100%
14.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	481,29	589,43	1.178,86	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	1.178,86	100%
14.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	330,96	405,32	2.431,92	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	2.431,92	100%
14.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	71,57	87,65	438,25	0,00	0%	R\$ 0,00	5,00	438,25	100%
14.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	153,51	188,00	752,00	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	752,00	100%
14.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	51,77	63,40	253,60	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	253,60	100%
14.10	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	4,00	49,52	60,64	242,56	0,00	0%	R\$ 0,00	4,00	242,56	100%
14.11	PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	8,00	52,80	64,66	517,28	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	517,28	100%

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - AV.

SEMECT	
Proc. nº	389/22
Folha nº	1335
Responsável	<i>Am</i>

788
- CEP 76890-000

Folhas nº 2.130

CANCELADO
Proc. nº 389/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



14.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	33,73	41,30	330,40	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	330,40	100%
15.0	DRENAGEM PLUVIAL											
15.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	64,00	636,91	780,02	49.921,28	0,00	0%	R\$ 0,00	12,00	9.360,24	19%
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	140,00	35,84	43,89	6.144,60	0,00	0%	R\$ 0,00	138,00	6.056,82	99%
15.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	70,00	28,80	35,27	2.468,90	0,00	0%	R\$ 0,00	68,00	2.398,36	97%
15.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	595,00	53,54	65,57	39.014,15	0,00	0%	R\$ 0,00	315,00	20.654,55	53%
15.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	320,00	65,10	79,72	25.510,40	0,00	0%	R\$ 0,00	320,00	25.510,40	100%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA											
									R\$ 0,00			

SEMECT
Proc. nº <u>389/22</u>
Folha nº <u>1336</u>
<u>Am</u> Responsável



GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 – CREA/RO 8918-EM – CAU PJ 423551 – Av. Rio Branco, 2378, Centro/Jaru/RO - CEP 76890-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



16.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,05	8,77	10,74	1.343,03	0,00	0%	R\$ 0,00	125,05	1.343,04	100%
16.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,81	16,34	20,01	296,34	0,00	0%	R\$ 0,00	14,81	296,35	100%
16.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,58	13,31	16,30	25,75	0,00	0%	R\$ 0,00	1,58	25,75	100%
16.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	535,51	10,20	12,49	6.688,51	0,00	0%	R\$ 0,00	535,51	6.688,52	100%
16.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,92	13,87	16,98	219,38	0,00	0%	R\$ 0,00	12,92	219,38	100%
16.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	193,33	8,33	10,20	1.971,96	0,00	0%	R\$ 0,00	193,33	1.971,97	100%
16.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,19	15,91	19,48	393,30	0,00	0%	R\$ 0,00	20,19	393,30	100%

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1337

Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-43 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 08000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2.132
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



16.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,20	12,84	15,72	191,78	0,00	0%	R\$ 0,00	12,20	191,78	100%
16.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	828,03	9,72	11,90	9.853,55	0,00	0%	R\$ 0,00	828,03	9.853,56	100%
16.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,21	13,87	16,98	597,86	0,00	0%	R\$ 0,00	35,21	597,87	100%
16.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	128,27	20,72	25,37	3.254,20	0,00	0%	R\$ 0,00	128,27	3.254,21	100%
16.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,11	7,72	9,45	123,88	0,00	0%	R\$ 0,00	13,11	123,89	100%
16.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,05	13,91	17,03	205,21	0,00	0%	R\$ 0,00	12,05	205,21	100%
16.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.068,5 1	7,74	9,47	29.058,78	0,00	0%	R\$ 0,00	3.068,5 1	29.058,79	100%
16.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.738,6 9	3,44	4,21	19.949,88	0,00	0%	R\$ 0,00	4.738,6 9	19.949,88	100%

SEMECT

Proc nº 389/22

Folha nº 1338

ama
Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

CANCELADO

Proc. nº 389/22

Folhas nº 2133

SPR
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS

16.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.320,65	5,65	6,91	16.035,69	0,00	0%	R\$ 0,00	2.320,65	16.035,69	100%
16.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	334,64	23,39	28,64	9.584,08	0,00	0%	R\$ 0,00	334,64	9.584,08	100%
16.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	353,05	31,59	38,68	13.655,97	0,00	0%	R\$ 0,00	353,05	13.655,97	100%
16.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	20,36	24,93	822,69	0,00	0%	R\$ 0,00	33,00	822,69	100%
16.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	32,22	39,45	78,90	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	78,90	100%
16.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	6,74	8,25	16,50	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	16,50	100%
16.22	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	8,99	11,01	198,18	0,00	0%	R\$ 0,00	18,00	198,18	100%
16.23	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	426,00	5,09	6,23	2.653,98	0,00	0%	R\$ 0,00	426,00	2.653,98	100%
16.24	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -	UN	20,00	11,70	14,32	286,40	0,00	0%	R\$ 0,00	20,00	286,40	100%

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1339

Responsável

Folhas nº 2.134

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015																			
16.25	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	98,00	3,84	4,70	460,60	0,00	0%	R\$ 0,00	98,00	460,60	100%								
16.26	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	14,52	17,78	213,36	0,00	0%	R\$ 0,00	12,00	213,36	100%								
16.27	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,75	14,39	14,39	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	14,39	100%								
16.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00	10,56	12,93	633,57	0,00	0%	R\$ 0,00	49,00	633,57	100%								
16.29	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	16,07	19,68	177,12	0,00	0%	R\$ 0,00	9,00	177,12	100%								
16.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	213,00	11,48	14,05	2.992,65	0,00	0%	R\$ 0,00	213,00	2.992,65	100%								
16.31	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	17,92	21,94	219,40	0,00	0%	R\$ 0,00	10,00	219,40	100%								
16.32	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - AF_12/2015	UN	38,00	32,98	40,39	1.534,82	0,00	0%	R\$ 0,00	38,00	1.534,82	100%								

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1340

Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

Página 19 de 30

Proc. nº 389/22
Folhas nº 2.135
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	6,00	23,27	28,49	170,94	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	170,94	100%
16.33	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	6,00	23,27	28,49	170,94	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	170,94	100%
16.34	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	5,00	24,21	29,64	148,20	0,00	0%	R\$ 0,00	5,00	148,20	100%
16.35	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	154,00	21,52	26,35	4.057,90	0,00	0%	R\$ 0,00	154,00	4.057,90	100%
16.36	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020	UN	13,00	23,02	28,19	366,47	0,00	0%	R\$ 0,00	13,00	366,47	100%
16.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	55,00	8,61	10,54	579,70	0,00	0%	R\$ 0,00	55,00	579,70	100%
16.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	9,07	11,10	22,20	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	22,20	100%
16.39	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	6,00	41,18	50,43	302,58	0,00	0%	R\$ 0,00	6,00	302,58	100%
16.40	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	32,00	42,10	51,55	1.649,60	0,00	0%	R\$ 0,00	32,00	1.649,60	100%
16.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	51,68	63,29	126,58	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	126,58	100%
16.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN	2,00	55,93	68,49	136,98	0,00	0%	R\$ 0,00	2,00	136,98	100%

SEMECT	
Proc. nº	389/22
Folha nº	1341
Am Responsável	

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

Responsável

Folhas nº 2.136

Proc. nº 389/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



16.51	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, SOBREPOR LED DE 36W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	275,00	52,30	64,05	17.613,75	0,00	0%	R\$ 0,00	275,00	17.613,75	100%
16.52	LUMINÁRIA LED QUADRADA EMBUTIR 30 W	UN	25,00	185,18	226,78	5.669,50	0,00	0%	R\$ 0,00	25,00	5.669,50	100%
16.53	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	154,00	8,12	9,94	1.530,76	0,00	0%	R\$ 0,00	154,00	1.530,76	100%
16.54	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	11,88	14,54	261,72	0,00	0%	R\$ 0,00	18,00	261,72	100%
16.55	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	21,91	26,83	1.019,54	0,00	0%	R\$ 0,00	38,00	1.019,54	100%
16.56	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	5,55	6,79	88,27	0,00	0%	R\$ 0,00	13,00	88,27	100%
16.57	CAIXA DE PISO EM LIGA DE ALUMÍNO 4X2 FECHADA E BAIXA	UND	7,00	27,20	33,31	233,17	0,00	0%	R\$ 0,00	7,00	233,17	100%
17.0	SPDA					103.867,65			R\$ 0,00			
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	59,40	62,93	77,07	4.577,95	0,00	0%	R\$ 0,00	33,40	2.574,14	56%
17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	396,00	45,72	55,99	22.172,04	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1343
Assinatura Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000005247209 - CREA/RO 8518-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

CANCELADO
Folhas nº 2.138
Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	841,00	49,17	60,21	50.636,61	0,00	0%	R\$ 0,00	841,00	50.636,61	100%
17.4	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	253,00	27,18	33,28	8.419,84	0,00	0%	R\$ 0,00	253,00	8.419,84	100%
17.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	70,00	62,82	76,93	5.385,10	0,00	0%	R\$ 0,00	18,00	1.384,74	26%
17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	28,72	35,17	281,36	0,00	0%	R\$ 0,00	8,00	281,36	100%
17.7	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	122,00	149,41	149,41	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	149,41	100%
17.8	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	89,10	109,12	109,12	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	109,12	100%
17.9	MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	145,75	178,50	178,50	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	178,50	100%
17.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	23,43	28,69	286,90	0,00	0%	R\$ 0,00	-	-	0%
17.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	17,39	21,29	212,90	0,00	0%	R\$ 0,00	10,00	212,90	100%
17.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	15,96	19,54	195,40	0,00	0%	R\$ 0,00	10,00	195,40	100%
17.13	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	44,00	46,96	57,51	2.530,44	0,00	0%	R\$ 0,00	44,00	2.530,44	100%

CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2.140

Responsável

GTX ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 08000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-009

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1344

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIRÓPOLIS



17.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	16,07	19,68	295,20	0,00	0%	R\$ 0,00	15,00	295,20	100%
17.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	10,17	12,45	186,75	0,00	0%	R\$ 0,00	15,00	186,75	100%
17.16	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	102,00	29,69	36,36	3.708,72	0,00	0%	R\$ 0,00	102,00	3.708,72	100%
17.17	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	1,00	22,47	27,51	27,51	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	27,51	100%
17.18	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	44,00	40,74	49,89	2.195,16	0,00	0%	R\$ 0,00	44,00	2.195,16	100%
17.19	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIORES E INFERIORES PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 40 X 40 cm - DPS CLASSE 1 E FUSIVEL DIAZED 63A	PÇ	1,00	428,57	524,86	524,86	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	524,86	100%
17.20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	59,40	24,66	30,20	1.793,88	0,00	0%	R\$ 0,00	59,40	1.793,88	100%
18.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA					6.539,69			6.539,69			
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.030,96	2,63	3,22	6.539,69	0,00	0%	R\$ 0,00	2.030,96	6.539,69	100%

SEMECT

Proc. nº 389/22

Folha nº 1345

Am

Responsável

CANCELADO

Proc. nº 389/22

Folhas nº 2.141

SR

Responsável


GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 - CREA/RO 8918-EM - CAU PJ 423551 - Av. Rio Branco, 2378, Centro Jaru/RO - CEP 76890-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEIXEIROPOLIS



17.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	16,07	19,68	295,20	0,00	0%	R\$ 0,00	15,00	295,20	100%
17.15	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	10,17	12,45	186,75	0,00	0%	R\$ 0,00	15,00	186,75	100%
17.16	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	102,00	29,69	36,36	3.708,72	0,00	0%	R\$ 0,00	102,00	3.708,72	100%
17.17	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	1,00	22,47	27,51	27,51	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	27,51	100%
17.18	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	44,00	40,74	49,89	2.195,16	0,00	0%	R\$ 0,00	44,00	2.195,16	100%
17.19	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIORES E INFERIORES PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 40 X 40 cm - DPS CLASSE 1 E FUSIVEL DIAZED 63 A	PC	1,00	428,57	524,86	524,86	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	524,86	100%
17.20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	59,40	24,66	30,20	1.793,88	0,00	0%	R\$ 0,00	59,40	1.793,88	100%
18.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA					6.539,69			6.539,69			
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.030,96	2,63	3,22	6.539,69	0,00	0%	R\$ 0,00	2.030,96	6.539,69	100%



2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2.143
[Signature]
Responsável

Figura 1: Percentual da estrutura metálica do telhado montada;



Figura 2: Percentual da estrutura metálica do telhamento com telha fibrocimento;

GTX ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.300.342/0001-13 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005247209 – CREA/RO 8918-EM – CAU P 422551 - Av. Rio Branco, 1347
Centro Jaru/RO - CEP 76890-000

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 2.147
[Signature]
Responsável

CANCELADO



Proc. nº 389122
Folhas nº 2.144

Responsável

Figura 3: Telhamento com telha fibrocimento;

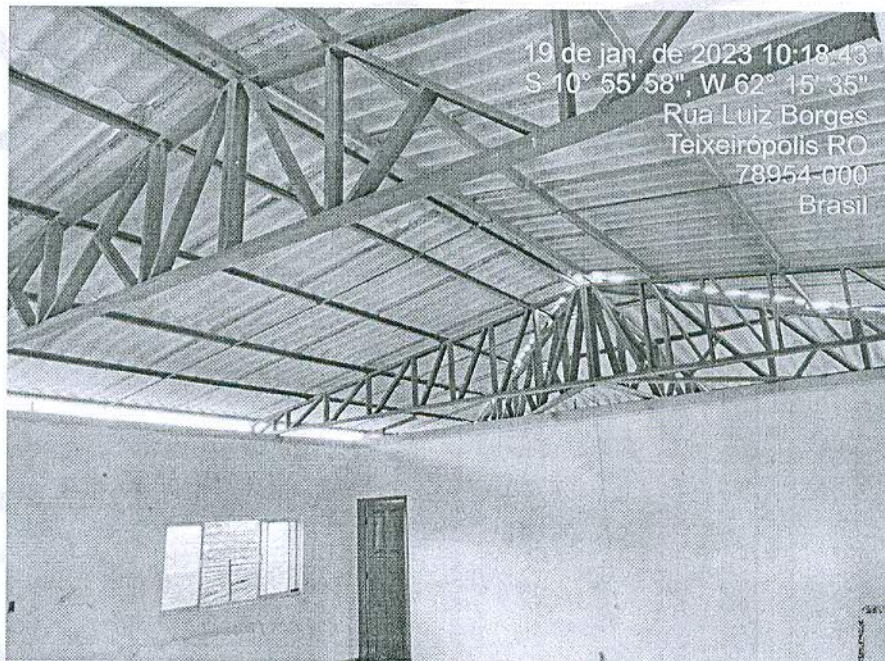


Figura 4: Telhamento com telha fibrocimento;

SEMECT
Proc. nº 389122
Folha nº 1348

Responsável



CANCELADO
Proc. nº 389122
Folhas nº 2.145
[Signature]

Figura 5: Pilares concretados e forma de viga respaldo sendo montada;



Figura 6: Pilares concretados e forma de viga respaldo sendo montada;



Figura 7: Pilares concretados e forma de viga respaldo sendo montada;

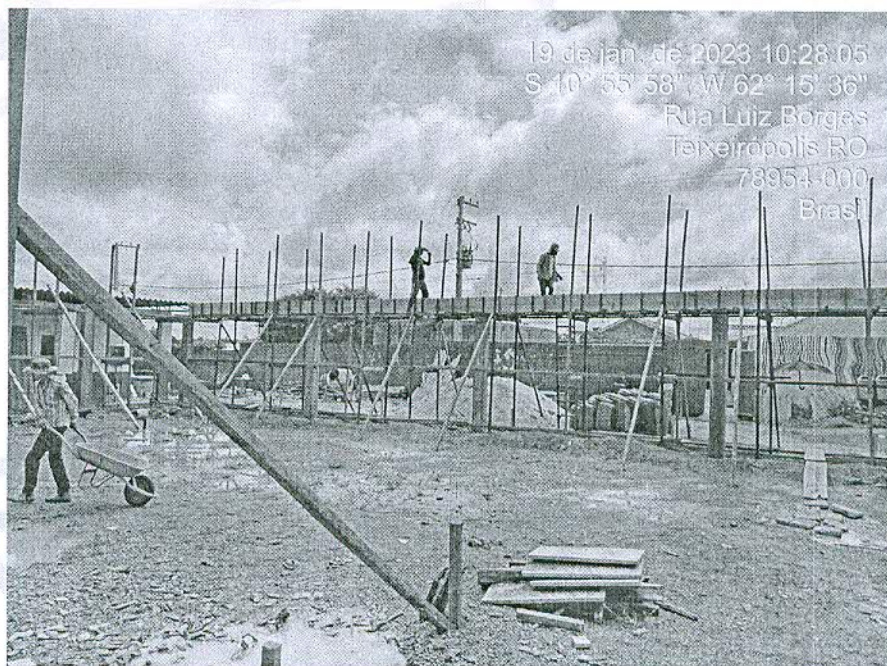


Figura 8: Pilares concretados e forma de viga respaldo sendo montada na área do pátio;



CANCELADO
Proc. nº 389/22
Folhas nº 2.147

Responsável

Figura 9: Fundação sendo executada na área da sala de aula;



Figura 10: Fundação sendo executada na área da sala de aula;

SEMECT
Proc. nº 389/22
Folha nº 1351

Responsável

3. CONCLUSÕES:

Diante das informações citadas acima segue para posterior decisão da Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis, através do Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, para pagamento conforme descrição a seguir:

VALOR A SER PAGO (EXPRESSO EM NOTA FISCAL)	R\$ 92.888,47
(NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
PORCENTAGEM EXECUTADA	7%

Teixeiraópolis/RO, 20 de janeiro de 2023.



AMANDA NOVAIS
LOREDO DE
MELO:01280334282

Assinado de forma digital por AMANDA NOVAIS
LOREDO DE MELO:01280334282
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR RIO
MADEIRA, ou=Presencial, ou=23035197000108,
cn=AMANDA NOVAIS LOREDO DE MELO:01280334282

GTX SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.300.342/0001-13

